



PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL

CLIENTE: ECOPARQUE-CA

RAZÃO SOCIAL: ECOPARQUE HABITACOES SUSTENTAVEIS LTDA

Cidade: Cascavel - PR

Fone: 4143016044

E-mail: guilherme@ecoparque.com.br

At.: Sr.Guilherme Lacerda Zandoná

Ref.: A FAZENDA ANDRADA, BR 277,KM 600

EMPREENDIMENTO

Ecoparque - Frigo 70 - Cascavel PR

Cascavel - PR

Atendendo vossa solicitação e baseados em dados fornecidos por V.Sas., apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Sistema Termoisolante para a obra em referência.

Na expectativa de um pronunciamento de V.Sas., colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA

Fone: +55 (47) 99984-3018

silvio@danica.com.br

Visite nosso site




ORÇAMENTO: 216626 V. 1

DATA: 10/07/2023

PERFIL DÂNICA

Produção de painéis termoisolantes em larga escala

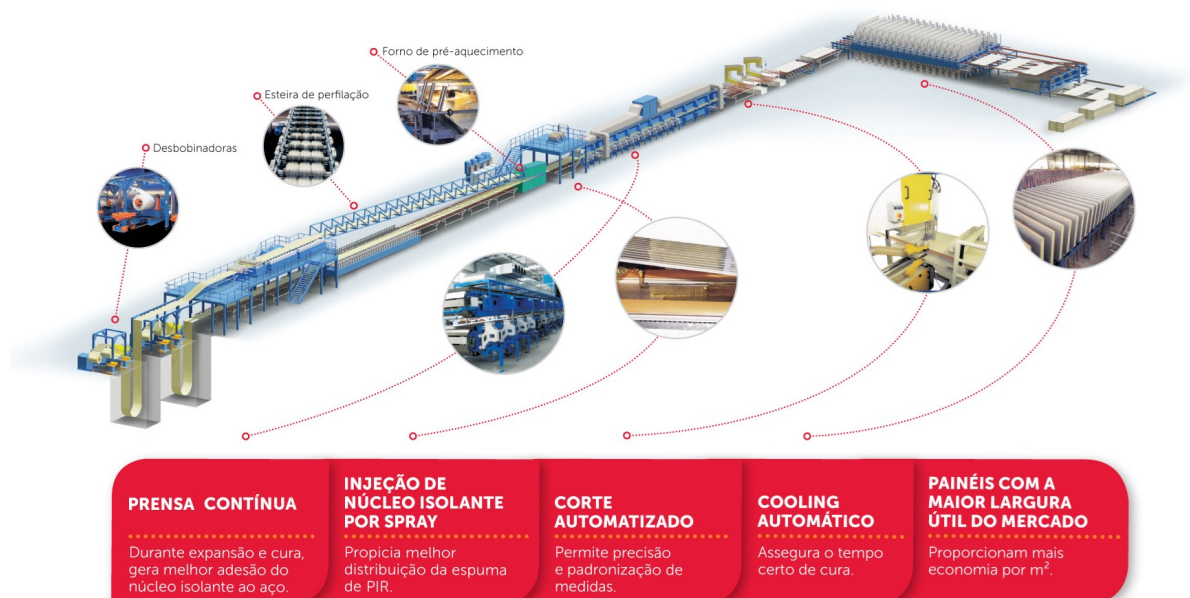

CLASSIFICAÇÃO DE FLAMABILIDADE




Euroclass	Inglaterra	Alemanha	França	Suécia	Itália	Holanda	Laudos	Brasil	Brasil	Tipo de isolamento
EM 13501-1, A1:2009	Approved Docs B of Building Regulations	Bauregel-listen, 26th March 2012	Arrete 21/11/02	BBR:2012, EM 13501-1	Decreto del Ministero 15/03/05	Bouwbesluit 2012	Internacionais	Método SBI, IPT Após 2011 IT 10 2011	NBR Até 2010 IT10 2004	
A1	Não combustível	A1	Não combustível	A1 Não combustível	Class 0	Não combustível		Classe I Incombustível	Incombustível	LDR/ LDV
A2	Combustível limitado	A2	M0 ou M1	A2 Combustível limitado	Class 1 ou Class 2		UL	Classe IIA Combustível	NBR 15575 (Retardante)	PIR
B	Class 0	B1	M1	B Class 1	Class 1 ou Class 2	Class 1 ou Class 2	UL	Classe IIB Combustível	NBR 15575, NBR 15366 (Retardante)	
C	Class 1	B1	M2	C Class 2	Class 2 ou Class 3	Class 3		Classe IIIA&B Combustível	NBR 15366, NBR 7358 Retardante Classe R1	PUR
D	Class 3	B2	M3	D Class 1	Class 3	Class 4		Classe IVA&B Combustível	NBR 7358 Retardante Classe R1	
E		B2	M4	E				Classe VA&B Combustível	NBR11948	EPS
F		B3		F				Classe VI Combustível		

PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO

• PROJETO UTILIZADO

 C-304346-001_B.DWG 6 MB	 C-304346-001_B.PDF 7 MB
--	--

• ÁREAS CONSIDERADAS

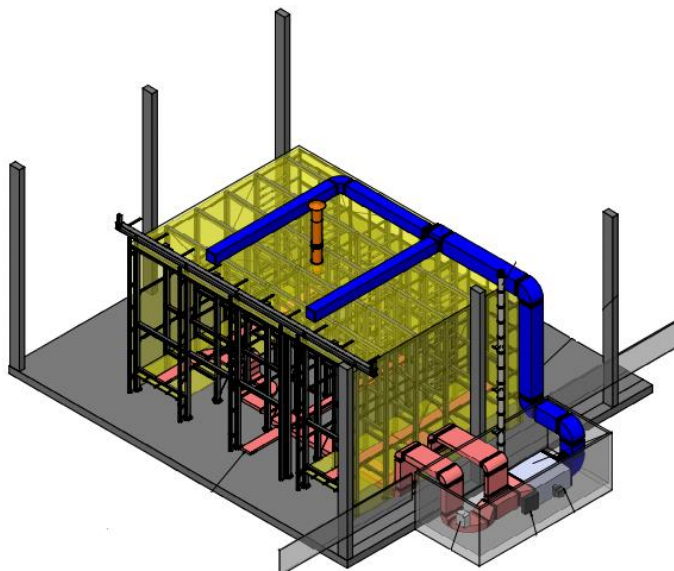

LEGENDA	
	FRIGOPAINEL 70 PIR HP 0,43 9003 - 0,43 9003

Notas:

1. Visto que a estrutura metálica não é fornecimento Dãnica, a contratante deve garantir os espaçamentos máximos para as estruturas secundárias, conforme as tabelas de autoportância dos materiais acima.
2. Essa proposta está considerando as dimensões do projeto em formato .dwg.

Notas MO:


1. Um supervisor da Dãnica deverá visitar o local para verificar as condições de montagem, após a avaliação os equipamentos e cronograma da obra deverão ser revisados.
2. Inclusa mão de obra e supervisão para montagem;
3. Os equipamentos para montagem são por conta do Contratante;
4. A armazenagem dos produtos será em local coberto por conta do Contratante;
5. Descarte do entulho gerado será de responsabilidade da Dãnica. Os resíduos da construção deverão ser designados em local correto;
6. O acesso à obra deverá ter condições trafegáveis a carreta (caminhões pesados);
7. Todos os itens foram orçados de acordo com o padrão de fornecimento e dimensionais Dãnica;
8. Este orçamento contempla somente os itens indicados e referentes aos ambientes citados. Não consideramos, portanto, itens não relacionados ou eventuais áreas anexas.
9. A Dãnica está **considerando área livre e desimpedida para montagem**, caso ocorram desvios internos e dificuldade de movimentação de materiais para montagem, os custos gerados serão repassados ao Contratante.
10. Não incluso equipamento para içamento dos materiais até os pavimentos, o transporte dos materiais até os pavimentos/ transporte vertical será de responsabilidade da contratante;

DESCRITIVO DOS MATERIAIS TERMOISOLANTES

FRIGOPAINEL PIR

Produzido em linha contínua, constituídos por dois revestimentos metálicos, conforme norma NBR 7013/03 e ASTM A 924/97, interligados por um núcleo de PIR (Espuma de Poliisocianurato), com massa específica aparente moldada (MEAM) de 28 a 31 kg/m³ e condutividade térmica máx. 0,022 W/mK, classificados como CLASSE II-A conforme IT-10 (Instrução técnica N° 10 – Corpo de Bombeiros SP).

Revestimento: Ambas as faces em chapa de aço galvanizado pré-pintado.



Informações Técnicas - FRIGOPAINEL								
Espessura do núcleo isolante	Espessura dos revestimentos Externo/Interno	Material do núcleo isolante	Peso próprio (estimado)	Coefficiente Global de Transmissão de calor *	Largura útil	Comprimento mínimo	Comprimento máximo	Vão Máximo **
(mm)	(mm)		(Kg/m ²)	(W/m ² .K)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
30	0,38/0,38	PIR	7,55	0,6167	1120	2500	12000	2700
	0,43/0,43		8,35					2800
	0,50/0,50		9,55					2950
40	0,38/0,38		7,91	0,4782	1120	2500	12000	3200
	0,43/0,43		8,75					3400
	0,50/0,50		9,93					3650
50	0,38/0,38		8,30	0,3885	1120	2500	12000	3550
	0,43/0,43		9,15					3800
	0,50/0,50		10,30					4100
70	0,38/0,38		9,05	0,2836	1120	2500	12500	4200
	0,43/0,43		9,90					4500
	0,50/0,50		11,10					4800
100	0,38/0,38		10,20	0,2018	1120	2500	12500	5050
	0,43/0,43		11,10					5350
	0,50/0,50		12,20					5800
120	0,38/0,38		10,96	0,1693	1120	2500	12500	5500
	0,43/0,43		11,80					5850
	0,50/0,50		12,98					6300
150	0,43/0,43		12,95	0,1363	1120	2500	15000	6550
	0,50/0,50		14,15					7000
200	0,43/0,43		14,85	0,1029	1120	2500	15000	7400
	0,50/0,50		16,10					7900


❖ Junta de Painéis

Executada longitudinalmente com mastique elástico de um componente que será aplicado após limpeza da superfície dos painéis para permitir uma perfeita aderência.

❖ Encontro dos Painéis

Os encontros de parede/teto, parede/parede e emendas de topo, serão vedados com mastique elástico aplicado sobre a superfície dos painéis, e receberão perfis de acabamento na mesma cor dos painéis, fixados com rebites de alumínio.

Para áreas com temperatura negativa, a junção receberá injeção de poliuretano, contemplando desta forma perfeita e segura ocupação do espaço. Os encontros de parede/teto, parede/parede e emendas de topo, serão vedados com manta auto adesiva, aplicada sobre a superfície dos painéis, e receberão perfis de acabamento na mesma cor dos painéis, fixados com rebites de alumínio.



❖ Apoio dos Painéis

Sobre perfis de acabamento em chapa de aço zincada, previamente posicionada sobre piso de concreto nivelado. Haverá vedação com mastique e fixação com parafusos, buchas e rebites. Sugerimos a execução de rodapés de concreto como proteção mecânica.

❖ Sustentação dos Painéis de Teto

Serão sustentados em tirantes de aço SAE 1010/1020 diâm. 3/8", roscados, para permitir um perfeito nivelamento e ajuste, **fixados externamente à estrutura metálica de fornecimento do cliente**. As hastes serão revestidas por uma camada de zinco pelo processo de eletrodeposição e terão uma espessura uniforme de até 25 micra.

Obs.: A distância entre a face superior do painel de teto e a face inferior da longarina metálica do cliente, deverá ficar entre 300 a 350mm. Caso esta distância seja maior, será necessária uma estrutura de fixação mais robusta, o que ocasionará ajustes dos preços dos acessórios. O comprimento padrão da haste Dânica é de 1000mm.

❖ Fixação dos Painéis de Parede

Em chapas de aço soldadas SAE 1010/1020, formando um conjunto próprio e exclusivo. Os painéis serão **fixados externamente às longarinas do fechamento de fornecimento do cliente**, em um nível pré-determinado no projeto e serão revestidos por uma camada de zinco pelo processo de eletrodeposição e terão uma espessura uniforme de até 25 micra.

VÁLVULAS EQUALIZADORAS DE PRESSÃO

Serão fornecidas válvulas para equalizar a pressão interna/externa, construídas em alumínio fundido e flanges de PVC soldável. Para as câmaras com temperaturas abaixo de 0°C, as válvulas possuem uma resistência elétrica para aquecimento.

1. PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS						
Código	Descrição	Qtd. Total	Un	IPI (%)	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90040002	PRE-FABRICADO FRIGOPAINEL 70 PIR HP 0,43 9003 - 0,43 9003	825,7088	M2	0,00	130,7437	107.956,2237
90050005	PRE-FABRICADO ACESSORIOS FRIGOPAINEL	825,7088	M2	0,00	32,3558	26.716,4688
Materiais (R\$)						134.672,6925
IPI (R\$)						0,0000
Frete (R\$)						9.564,3883
IPI do Frete (R\$)						0,0000
Total materiais (R\$)						144.237,0807
Total de mão de obra (R\$)						67.675,0957
Total de equipamentos (R\$)						13.246,7003
Total Geral da Oferta Dânica (R\$)						225.158,8767

FATURAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	
Código	Faturamento
SERV0702	Serviços de mão de obra
SERV0001	Locação de equipamentos

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS			
Quantidade	Descrição	Tempo	Unidade
1	SUL- CAÇAMBA PARA ENTULHO 25 M³ (R\$190,00 AO M³) (3 TROCAS)	1,00	ms

2. PAGAMENTO

2.1 PAGAMENTO DOS MATERIAIS:

0.00% DE SINAL - SALDO EM 28 DDF

Fica autorizada a emissão de boletos bancários, bem como a cessão a terceiros dos direitos creditórios gerados com base nas operações de compra e venda que venham a realizadas com base na presente proposta, na medida em que se concretizem tais operações de compra e venda.

O departamento financeiro somente irá liberar o pedido para projetos e produção dos materiais, após o recebimento do sinal.

2.2 PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA

0.00% DE SINAL - SALDO EM 28 DDF

Notas

- A condição de pagamento prevista na presente Proposta Técnica Comercial está sujeita à aprovação de crédito pelo Financeiro da Dânica.
- Havendo parcelamento da condição de pagamento apresentada acima, as mesmas serão acrescidas de custo financeiro.
- O prazo de pagamento é contado a partir da data que o material estiver pronto para embarque.
- Se, por razões alheias a responsabilidade da Dânica o cronograma financeiro elaborado entre as partes for prejudicado por sofrer atrasos ou interrupções, fica desde já acordado que as parcelas dos respectivos pagamentos atrelados deverão, automaticamente, terem sua continuidade em suas liberações.
- O comprovante de depósito / ordem de compra deverá ser enviado escaneado para o email pedidos@danica.com.br ou para o fax (47) 3461-5353 com identificação do cliente.
- Supervisor/Engenheiro de Obras Dânica fará visitas pré-programadas à obra para orientação técnica dos trabalhos executados pelo Montador. Todas as visitas deverão ter acompanhamento do cliente.
- Todo o material de montagem enviado para a obra em excesso é de propriedade da DÂNICA, devendo ser retirado na finalização dos serviços de montagem.

3. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Para que o processo siga de forma ininterrupta e que os prazos acordados em negociação sejam atendidos, abaixo segue relação responsabilidade do cliente:

- Pagamento do sinal em dia;
- Envio dos projetos base conforme alinhado entre as partes;
- Aprovação do projeto executivo em dia;
- Frente de trabalho ininterrupta (caso haja montagem);
- Aprovação das medições de montagem em dia (caso haja montagem);
- Pagamentos em dia.
- A fabricação de materiais é conforme cronograma aprovado com cliente.
- Atrasos nos itens destacados poderão incorrer em postergações proporcionais aos dias de atraso.

4. IMPOSTOS INCLUSOS

Materiais: ICMS (12,00%), PIS (1,65%) E COFINS (7,60%)

Serviços de Mão de Obra: (PIS, COFINS, ISS, INSS)

Locação de Equipamentos: (PIS, COFINS)

Notas

O ISS incidente sobre o faturamento dos serviços já está incluso no valor total desta proposta e será recolhido POR RETENÇÃO pela CONTRATANTE (ou PROPRIETÁRIA DA OBRA), no município da realização dos serviços objeto desta proposta.

Caso haja qualquer majoração das alíquotas dos impostos ora mencionados, tal majoração será automaticamente repassada para a CONTRATANTE, sobre o saldo a faturar da Proposta/Contrato.

Eventuais diferenciais de alíquotas interestaduais e municipais serão suportadas pela CONTRATANTE.

Eventual cobrança do Estado sobre o ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna (praticada no Estado destinatário) e a alíquota interestadual destinadas a contribuintes do ICMS ficam inteiramente sob responsabilidade do CONTRATANTE/CLIENTE

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:

Gerais	Dânica	Contratante	Fora do escopo
Execução	X		
Encargos sociais e trabalhistas de nossos funcionários	X		
Ferramentas para execução e montagem da obra	X		
Despesas de viagens, refeições e estadias de nossos funcionários	X		
Frete de materiais até a obra	X		
Recebimento, descarga e armazenagem dos materiais		X	
Fornecimento e montagem dos perfis metálicos para fixação dos painéis do teto e paredes		X	
Liberação da área do canteiro de obras		X	
Equipamentos para movimentação horizontal e vertical dos materiais		X	
Vestiários, instalações sanitárias e bebedouro		X	
Instalações administrativas		X	
Almoxarifado para guarda de materiais auxiliares e ferramentas		X	
Energia elétrica para a montagem da obra		X	
Custo de desmobilização da equipe em função: da paralisação da obra por atraso do serviço de terceiros e/ou sequenciamento na liberação de frente de montagem pelo cliente		X	
Aberturas para passagens de tubulações, eletrodutos, furos, luminárias, janelas, dutos de ventilação / exaustão, bem como suas vedações e acabamentos	X		
Reposição de materiais ou ferramentas danificados ou faltantes por terceiros que estão sob responsabilidade da guarda pela contratante no local da obra.		X	
Todo e qualquer trabalho de concreto, alvenaria e carpintaria		X	
Remoção de lixo e entulhos do canteiro de obras	X		
Seguro contra sinistro ou qualquer outro tipo de dano para os materiais durante o período de montagem	X		
Seguro garantia			X
Linha de vida permanente			X
Linha de vida provisória			X
Acesso a cobertura			X
Munck e guindaste para suportar a perfiladeira para perfilação das telhas zipadas			X
Qualquer outro item não claramente especificado na presente oferta		X	
Supervisão			
Orientação da montagem pelo nosso Supervisor	X		
Técnico de Segurança		X	
Encargos sociais e trabalhistas do nosso Supervisor	X		
Despesas de viagem, refeições e estadias do nosso Supervisor	X		
Definição, especificação e contratação de equipe de montagem	X		
Gerenciamento da equipe de montagem	X		
Gerenciamento do cronograma da obra	X		
Garantia de montagem	X		
Gerenciamento almoxarifado da obra	X		
Controle do material	X		

6. PARÂMETROS DE PROJETO

- As quantidades levantadas e constantes em nossa proposta baseiam-se nos desenhos relacionados nos produtos desta proposta.
- As quantidades finais serão apuradas após o recebimento dos projetos de arquitetura e de estrutura metálica, liberados para execução, que serão utilizados para elaboração nossos projetos de coberturas e fachadas.
- Após a execução dos nossos projetos básicos, será realizado um balanço de quantidades e de escopo que será apresentado, visando ajuste dos valores finais contratuais
- As furações e arremates para interferências nas coberturas e fachadas não relacionados nesta proposta serão levantados durante a fase de projeto ou de execução da obra (montagem) e seus custos serão repassados através de ASAs (Autorizações de Serviços Adicionais)

7. FRETE:

CIF – Por conta da Dânica - Cascavel/PR

ATENÇÃO: O VALOR DO FRETE SERÁ EMBUTIDO NO VALOR DOS MATERIAIS

Caso o faturamento / embarque dos materiais não aconteça em até 7 dias da data que o os mesmos estiverem prontos para embarque, será cobrado taxa de armazenamento de R\$ 50,00 / carretaria.

8. PRAZOS

8.1 PRAZOS DE PROJETO

A equipe de engenharia da Dânica atuará no desenvolvimento dos projetos imediatamente após o fechamento comercial do negócio, a implantação do pedido, a liberação financeira e, quando necessário, a disponibilização por parte do cliente das informações técnicas necessárias a elaboração do referido projeto.

Nos casos em que se aplicar, os projetos serão submetidos a aprovação do cliente e, somente após essa aprovação formal, serão disponibilizados para fabricação e consequentemente entrega

8.2 PRAZOS DE FABRICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS MATERIAIS

Os prazos de fabricação e expedição dos materiais passam a ser contados a partir do dia seguinte a aprovação dos projetos ou recebimento da relação de materiais e obedecerão:

- Cronograma a ser estabelecido entre as partes e/ou;
- Tabela de lead time abaixo:

TABELA DE LEAD TIME PARA PRODUTOS STANDARD		
DESCRIÇÃO	UNID.	DIAS ÚTEIS
FRIGOPAINEL PIR	M2	12

Notas

- O lead time de fabricação e expedição é contado em dias úteis a iniciar após aprovação dos projetos e aprovação financeira
- Onde o pedido extrapolar 5.000m² as entregas poderão ser fracionadas sendo, nesses casos, o cronograma negociado entre as partes.
- Em pedidos inferiores a 350m² poderão ocorrer variações do lead time em função da otimização de produção. Nesses casos o cronograma será pactuado entre cliente e Dânica.
- Produtos coloridos e não standard possuem prazos de entrega diferenciados, conforme definição no escopo técnico apresentado na presente proposta (PARÂMETROS ADOTADOS PARA CÁLCULO).

8.3 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:

- Em função da possível variação dos preços dos insumos, a prorrogação – por parte do cliente – do prazo de entrega de materiais poderá incorrer em renegociação dos preços. Opcionais para evitar este reajuste será (i) pagamento antecipado do material ou (ii) manter entregas conforme prazo acordado
- Caso haja prorrogação do prazo de entrega – por parte do cliente – após a fabricação ser aprovada, os custos de armazenagem serão por conta do cliente.

8.4 PRAZOS DE TRANSPORTE

Nos casos onde a responsabilidade do transporte for da Dânica, o prazo será calculado em função da região geográfica do local de entrega e, em cargas fracionadas, da composição de carga para a região de destino.

9. PARALISAÇÃO / SERVIÇOS EXTRAS

Qualquer paralisação provocada por terceiros e/ou serviços extracontratuais será debitado conforme tabela abaixo:

Diária do Montador.....	R\$ 800,00
Diária do Supervisor.....	R\$ 1.300,00
Diária do Engenheiro.....	R\$ 1.800,00

As diárias compreendem uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas, sendo que as horas extras terão acréscimo conforme CLT.

10. VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente Proposta Técnica Comercial tem validade de até 5 dias úteis, e vinculará as partes desde que enviada assinada e carimbada pelo cliente, dentro do prazo indicado.

Devido à possível variação no custo de insumos/commodities. Após o vencimento desta oferta, caso haja aumentos comprovados nos custos dos insumos utilizados na fabricação e/ou montagem dos materiais constantes na presente oferta, os valores expressos serão atualizados para adequação à nova realidade de preços.

11. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.

No recebimento dos materiais a CONTRATANTE deverá conferir a quantidade de volumes, bem como a integridade das embalagens e dos produtos entregues.

Recomendamos a remoção do filme de proteção do aço num prazo de 20 dias se o material estiver exposto a intempéries e de 30 dias caso o material estiver armazenado em local protegido. Este prazo é contado após o recebimento do material e visa evitar a impregnação da cola no painel.

Havendo alguma NÃO CONFORMIDADE deverá ser registrada no impresso anexo a nota fiscal ou no verso da mesma. O autor das anotações deverá assinar o documento, bem como escrever o nome legível, CPF e fone de contato. Qualquer discrepância de volume e/ou integridade das embalagens e/ou produtos posterior a sua entrega será por responsabilidade da CONTRATANTE.

12. RENEGOCIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.

Caso haja aumento comprovado nos custos dos insumos aplicados, mão de obra ou em quaisquer materiais utilizados em nossos produtos e que impliquem em alterações dos preços apresentados nesta proposta, deverão ser objeto de novos entendimentos entre as partes para a adequação dos valores dos contratos à nova realidade de preços, devidamente comprovados.

13. MODIFICAÇÕES DE PROJETO.

Caso ocorram modificações decorrentes de projeto (alterações nos quantitativos e nas especificações), em função do projeto final da obra, bem como "a posteriori" e que venham a exercer influência sobre os valores apresentados, serão motivos de alterações dos preços para mais ou menos, levando-se em conta também as eventuais extensões dos prazos de entrega dos materiais. A Dânica Sistemas Construtivos S.A. comprometer-se-á a estudar as modificações ocorridas e na medida do possível executar, sendo implícita a responsabilidade total do solicitante no que diz respeito às alterações de volumes de preços, prazos de entrega, sempre sujeitos a acordo por escrito entre as partes, através da assinatura de ASAs (autorização de serviços adicionais), antes da execução de tais modificações.

14. TERMO DE GARANTIA.

Garantimos a qualidade dos materiais de nosso fornecimento pelo prazo de 06 (seis) meses da data de entrega ou pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O período de garantia se inicia quando das liberações parciais, devidamente documentadas pela Dânica Sistemas Construtivos S.A. com aceite do cliente. O período de garantia cessará quando a instalação for submetida à utilização inadequada, negligência nas observações das instruções para operação e manutenção, emprego de peças não genuínas, modificações ou adaptações realizadas por pessoas não autorizadas. No caso de materiais de terceiros, repassaremos as condições de garantia de nossos fornecedores. A garantia aplica-se somente ao item danificado, não nos responsabilizando pelas consequências advindas de seu mau funcionamento, bem como não darão direito a indenizações de qualquer natureza ou retenção de parcelas devidas. Quando da inspeção e/ou execução no atendimento aos serviços de garantia, serão cobradas as despesas de viagens, estadia e refeições de nossos funcionários, bem como frete dos materiais de reposição.

Painéis coloridos (excluindo branco RAL 9003) expostos ao sol e que atinjam temperaturas do aço excedentes a 90 °C, especialmente os painéis de coloração mais escura, podem sofrer possíveis alterações estéticas (bolhas/delaminação). O aquecimento do aço pode variar dependendo da intensidade e ângulo que o sol se projeta na construção. *Dânica não oferece garantia de bolhas sobre painéis coloridos.*

15. TERMO E CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS.

O “de acordo” na presente Proposta Técnica Comercial vincula a Dânica e o Cliente, bem como seus herdeiros e sucessores, conforme “Termos e Condições Gerais para o Fornecimento e/ou Prestação de Serviços pela DÂNICA SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.”, o qual encontra-se registrado sob o nº 241807, Livro B-810, Folhas 161V, no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Joinville/SC, Maíra Martins Crespo.

16. FATURAMENTO DOS MATERIAIS

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Avenida Presidente Vargas, 504

Distrito Industrial Gilberto Nunes da Rocha

79.570-000 – Aparecida do Taboado – MS

CNPJ: 42.506.618/0005-00

Inscrição Estadual: 28.346.291-4

Inscrição Municipal: 100099

Informações para depósito:

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Banco: Money Plus - 274 | Agencia:0001 | Conta: 08120532-0

17. FATURAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A. – JOINVILLE SC

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AV. Edgar Nelson Meister nº 1242 - INOVAPARQ - Joinville - SC

89.219-501 – Joinville – SC

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Inscrição Estadual: 253.848.040

Inscrição Municipal: 60.615

Informações para depósito:

DÂNICA SOLUÇÕES TERMOISOLANTESINTEGRADAS S.A.

CNPJ: 42.506.618/0001-78

Banco: Money Plus - 274 | Agencia:0001 | Conta: 08120532-0

Assinatura do Cliente

OBS: Todas as páginas da proposta devem estar rubricadas.
